

NOTIFICACIÓN
VOLADURA DE ROCA EN ÁREA
28

El VIERNES 24 MAYO 2013

ENTRE LAS


16:00 Y LAS 18:00

ZONAS SEGURAS:

1. ÁREA 29 Y ARRIBA
2. ÁREA 4 (CAMPAMENTO)
3. ÁREA 12 Y ARRIBA? I.M.I.

SIGUA LAS INSTRUCCIONES
DE LAS GUARDAS DE LA VOLADURA

Voladura @ **Viernes 24 Mayo 4 - 6 PM**

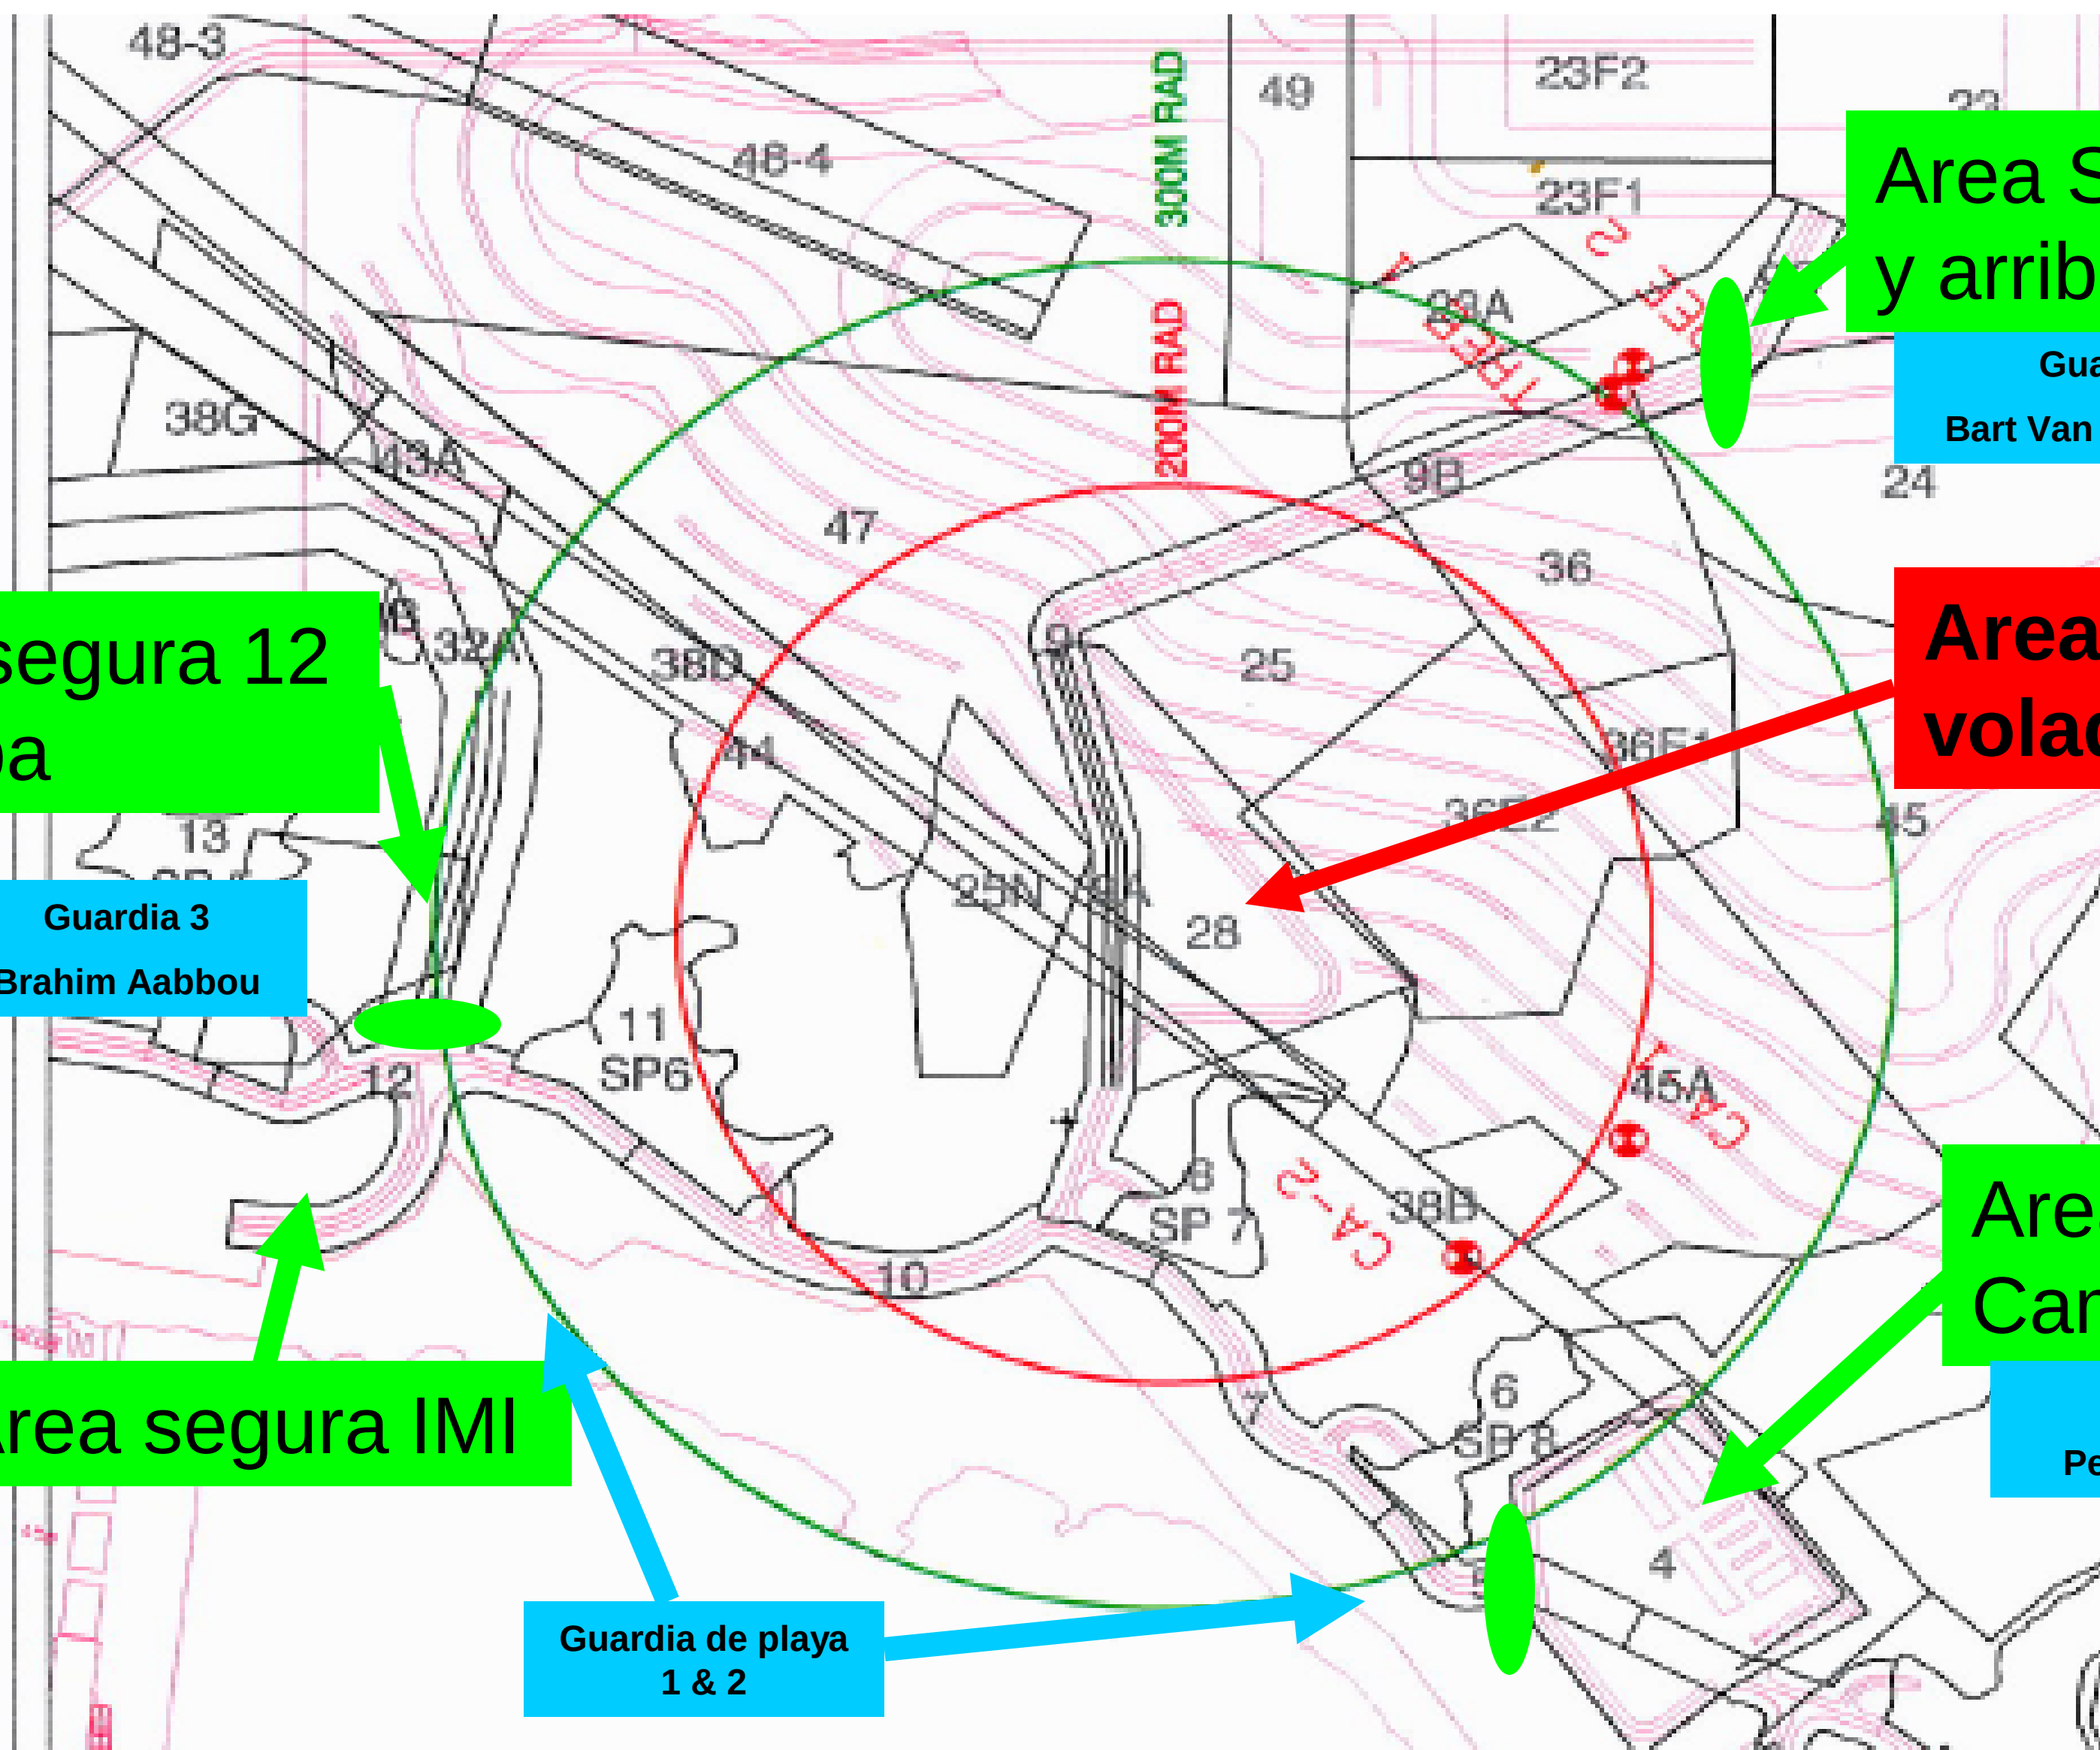

VOLADURA – PASO A PASO

- **Procedimiento General de la Voladura**
-

1. Cuando se cargan todos los huecos, el **Explosivista** contacta el **Controlador de voladura**
2. El **Controlador de voladura** contacta los **Guardias de voladura**, para checkear sus áreas (clearance to start calmly)
3. 45 mins antes de la voladura, el **Controlador de voladura** informa al **Explosivista** para empezar las conexiones
4. 30 mins antes de la voladura, el **Controlador de voladura** informa a los **Guardias de voladura** de los '30 minutos'.
5. 15 mins antes de la voladura, el **Controlador de voladura** verifica si el **Explosivista** está listo y pregunta a cada **Guardia de voladura** el status de su área. **Cuando "todo está claro y seguro"**:
6. **El Controlador de voladura** informa al **Explosivista** conectar la linea de fuego y retirarse a la posición de tiro y solicita guardar silencio en el radio.
7. 5.5 min antes de la voladura, el **Controlador de voladura** informa a los **Guardias de voladura** de los '5 minutos' sirena antes de la cuenta regresiva y pregunta confirmar si todo está claro y seguro
8. A los 5 min antes de la voladura el **Explosivista** inicia los 5 pitazos de sirena de 2-3 segundos.
9. El **Explosivista** informa cuando todo está listo para detonar las cargas y solicita permanecer a la espera.
10. El **Controlador de voladura** controla cada **Guardia de voladura** si 'todo está claro y seguro';
11. Si todo está OK, el **Controlador de voladura** informa al **Explosivista** 'ADELANTE' cuando todo está listo: área clara y segura
12. El **Explosivista** responde OK y el **Controlador de voladura** hace un Cuenta regresiva de 10 segundos en el Radio. El **Explosivista** procede con la detonación.
13. Cuando todo ha sido detonado, el **Controlador de voladura** informa a todos los **Guardias de voladura** y les solicita quedarse en su posición hasta que todo este claro. En caso de que algún hueco no haya detonado, el procedimiento se repite del punto 11. 'adelante' y punto de verificación. La gente y los equipos continuarán en una zona segura.
14. Cuando se ha recibido "todo está claro" del **Explosivista**, el **Controlador de voladura** informa por radio que se pueden continuar con el uso normal del radio y el **Explosivista** iniciará un conteo de 5-10 segundos con un pitazo de sirena que todo está claro.
15. El **Controlador de voladura** informará a los **Guardias de voladura** que el área está clara y que los **Guardias de voladura** pueden abrir su área (entrada / salida).

Final de la voladura
